

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» за 2018 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Благоустройство города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376. Реализация муниципальной программы завершена 31.12.2018.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление благоустройства Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы:

Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове

1.3. Задачи муниципальной программы:

- Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог;

- Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям;

- Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности;

- Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за расположенными на них зелеными насаждениями;

- Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ;

- Обустройство новых и увеличение площади существующих городских кладбищ;

- Выполнение строительства линии уличного освещения;

- Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»

Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»

Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ»

Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных»

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново» (реализация подпрограммы завершена в 2014 году)

Специальная подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования города Иванова» (реализация подпрограммы завершена в 2014 году)

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»

Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения»

Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2018 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 составил 1 010 263,65 тыс. руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 96,37 % (973 630,65 тыс. руб.).

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов выполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется объективными причинами.

Учитывая, что реализация муниципальной программы направлена на обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа «Благоустройство города Иванова», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376, прекратила свое действие, была разработана новая муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова» и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутых в отчетном году

Ключевым результатом реализации муниципальной программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.

В 2018 году в рамках муниципальной программы продолжилась работа в соответствии с задачами реализации муниципальной программы.

В рамках аналитической подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» продолжилась работа по поддержанию

в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, сокращению доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. Запланированные значения основных целевых индикаторов в 2018 году достигнуты. Произведен текущий ремонт более 79,6 тыс. м² дорожного покрытия, 11,3 тыс. м² площади тротуаров. Площадь дорожного покрытия, на которой проведен капитальный ремонт, составила 103,98 тыс. м². Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в отчетном году составил 8,57 км.

В ходе исполнения аналитической подпрограммы «Наружное освещение» продолжено поступательное увеличение протяженности сети уличного освещения. В 2018 году общая протяженность сети уличного освещения составила 763,69 км. Также произошло сокращение доли неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети до 15,2 %.

По результатам реализации специальной подпрограммы «Строительство объектов уличного освещения» протяженность вновь установленных объектов уличного освещения в 2018 году составила 0,958 км, а число установленных светильников на объектах уличного освещения – 37 единиц. На строительство объектов уличного освещения протяженностью 3,384 км разработана проектная документация.

В рамках аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» в отчетном году:

- обеспечено содержание более 158 тыс. м² муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов;

- очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений на протяжении 18 км улиц города;

- осуществлен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок в объеме более 50,7 тыс. м³, при организации субботников - более 6,1 тыс. м³, при сносе незаконно установленных строений – 171 м³;

- обеспечено содержание более 48,4 тыс. м² зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования;

- проведено цветочное оформление более 1,9 тыс. м² цветников и клумб;

- обеспечено санитарное содержание 19 120,88 тыс. м² газонов.

В рамках аналитической подпрограммы «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» на организацию и содержание мест захоронения,

а также благоустройство территории воинских захоронений в 2018 году предусмотрено 15,5 млн руб.

В 2018 году в рамках указанной программы к празднованию 73 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на воинских мемориалах в местечках Балино и Соснево проведены следующие работы:

- текущий ремонт воинских мемориалов (штукатурные, малярные работы, покраска скульптуры «Солдат» и т.д.);

- ремонт, покраска бетонных ограждений, металлических решеток;

- валка аварийных деревьев, корчевка пней, вырезка дикорастущей поросли;


- посадка цветов и озеленение территорий воинских мемориалов.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

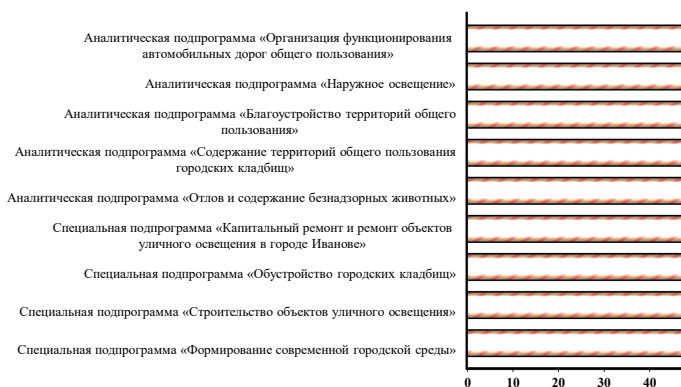

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения в целом достигнуты, фактическое значение некоторых целевых индикаторов выполнены с превышением планового, основными причинами чего являются: увеличение объема отремонтированных дорог, благодаря выделению дополнительных денежных средств за счет отпадающих видов работ.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 96,37 %.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100 %

Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за весь период ее реализации

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.

В период 2014-2018 годов реализация программы обеспечила решение следующих задач:

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

Реализация аналитической подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» позволила ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн м², включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн м² зимой и 2,6 млн м² летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. м²;

- обслуживание порядка 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 11 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы обеспечены текущий ремонт более 419 тыс. м² дорожного покрытия автомобильных дорог и более 147 тыс. м² тротуаров, а также устройство 4 новых светофорных объектов.

Реализация подпрограммы позволила провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении более 755 тыс. м² дорожного полотна, что к концу 2018 года обеспечило сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 41,16 % (на конец 2013 года доля составляла 53,00 %). На реализацию данной подпрограммы из бюджета города выделено порядка 3 млрд руб.

2. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности.

Реализация аналитической подпрограммы «Наружное освещение» позволила обслуживать и содержать в рабочем состоянии более 750 км линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 80% улично-дорожной сети города. Общее количество источников света (светоточек)

в сети уличного освещения города к концу 2018 года увеличилось и составило более 17,7 тысяч единиц. Также произошло сокращение доли неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети до 15,2 % (на конец 2013 года доля составляла 18,5 %).

3. Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за расположенными на них зелеными насаждениями.

В рамках аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» за весь период реализации муниципальной программы обеспечено ежегодное содержание более 158 тыс. м² муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов; осуществлена очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений на протяжении 37 км улиц города; осуществлен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок в объеме более 214,5 тыс. м³, при организации субботников - более 25,8 тыс. м³,

при сносе незаконно установленных строений – более 1,4 тыс. м³; обеспечено содержание более 286,4 тыс. м² зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования; рождено цветочное оформление более 11,4 тыс. м² цветников и клумб; обеспечено санитарное содержание 12,4 млн м² газонов. На реализацию данной подпрограммы из бюджета города выделено порядка 459 млн руб.

4. Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ.

Реализация подпрограммы «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» позволила обеспечить круглогодичное содержание более 2,5 млн м² территорий общего пользования городских кладбищ и более 16,2 тыс. м² территории воинских захоронений. Нарушений установленных сроков расчистки

от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время, а также письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги не зафиксировано.

5. Обустройство новых и увеличение площади существующих городских кладбищ.

Реализация специальной подпрограммы «Обустройство городских кладбищ» способствовала решению проблемы существующего дефицита мест для захоронений. В течение срока реализации подпрограммы дополнительно обустроено более 15,7 гектара городских кладбищ, что увеличило общее число мест захоронений на 16,656 тыс. на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское и на 14,8 тыс. на муниципальном кладбище в районе с. Ново-Талицы.

6. Выполнение строительства линии уличного освещения.

Реализация подпрограммы «Строительство объектов уличного освещения» позволила разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 8,687 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 11,789 км.

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Муниципальная программа «Благоустройство города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	1 010 263,65	973 630,65					Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади улично-дорожной сети (%)	36,19	36,19	
								Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям (%)	41,49	41,05	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с: - увеличением объема отремонтированных дорог, благодаря выделению дополнительных денежных средств за счет отпадающих видов работ; - отсутствием возможности своевременной корректировки планового значения целевого индикатора по результатам выполненных работ в пределах выделенного финансирования, ввиду сдачи актов выполненных работ в сроки, не позволяющие внести изменения в муниципальную программу
								Доля освещенных	84,80	84,80	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактически кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
								частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети (%)			
								Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий (%)	34,16	34,16	
								Доля обслуживаемых зеленых насаждений в общей площади зеленых насаждений на территориях общего пользования (%)	59	59	
								Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках (га)	1	1	
								Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения (км)	0,958	2,855	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием возможности своевременной корректировки планового значения целевого индикатора по

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
6.1.	Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	716 194,40	692 863,81	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: 54 805,3	Итого по подпрограмме: 70,5	_____	Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной рекламы (км)	18	18	результатам выполненных работ в пределах выделенного финансирования, ввиду сдачи актов выполненных работ в сроки, не позволяющие внести изменения в муниципальную программу
								Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании (тыс. кв. м)	3 080,88	3 080,88	
								Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров (раз за сезон)	40	40	
								Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании (тыс. кв. м)	2 650,90	2 650,90	
								Периодичность летней уборки дорог и тротуаров (раз за сезон)	36	36	
								Площадь моющихся дорог и тротуаров (тыс. кв. м)	1 666,99	1 666,99	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
								Периодичность мойки дорог и тротуаров (раз за сезон)	17	17	
								Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании (кв. м)	11 868,00	11 868,00	
								Протяженность ливневой канализации (м)	82 173,00	82 173,00	
								Общая площадь улично-дорожной сети (м)	7 325,44	7 325,44	
								Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) (единиц)	11	11	
								Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) (тыс. кв. м)	56,44	79,62	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением объема отремонтированных дорог, благодаря выделению дополнительных денежных средств за счет отпадающих видов работ
								Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного)	10,70	11,30	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов			
					по состоянию на									
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года								
											покрытия) (тыс. кв. м)			связано с увеличением объема отремонтированных тротуаров, благодаря выделению дополнительных денежных средств за счет отпадающих видов работ
									62,55	103,98	Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) (тыс. кв. м)			Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением объема выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту дорог, благодаря выделению дополнительных денежных средств за счет отпадающих видов работ
									41,49	41,05	Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям (%)			Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением площади дорожного покрытия, по который проведен ремонт и капитальный ремонт в соответствии с нормативными требованиями, и с увеличением общей протяженности дорог
									3 039,27	3 035,58	Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям (тыс. кв. м)			Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением
									6,161	8,573	Прирост протяженности автомобильных дорог общего			Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км), в том числе за счет:			объема выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту дорог, благодаря выделению дополнительных денежных средств за счет отпадающих видов работ	
							Капитального ремонта улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап) (км)	1,349	1,349		
							Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками (единиц)	8	8		
							Количество закупаемой техники (шт.)	11	11		
							Количество предписаний ГИБДД по устранению	0	148	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							дефектов дорожного полотна (единиц)				несвоевременным устранением дефектов дорожного полотна
	Мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	538 949,00	526 179,28		54 805,30	70,50	Мероприятие выполнено на 97,63 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с не востребова нностью денежных средств. Работы выполнены в полном объеме	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	11 896,59	10 527,99				Мероприятие выполнено на 97,63 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с отсутствием возможности проведения конкурентных процедур до конца отчетного года ввиду выделения дополнительных денежных средств в декабре отчетного года	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Проведение	413,00	404,50				Мероприятие выполнено на	_____	_____	_____	_____

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры» (управление благоустройства Администрации города Иванова)						97,94 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с сокращением количества исков о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова. Денежные средства расходуются в целях исполнения функций Администрации города Иванова при наличии потребности				
	Мероприятие «Приобретение специализированной техники» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	31 275,61	31 275,61				Мероприятие выполнено на 100 %	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое	133 660,20	124 476,43				Мероприятие выполнено на 93,13 %. Отклонение расходов на осуществление	_____	_____	_____	_____

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап)» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)						мероприятия связано с отпавшими видами работ, предусмотренными в проектно-сметной документации, что не повлияло на ввод объекта в эксплуатацию				
6.2.	Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	159 866,48	150 356,78	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: 17 858,00	Итого по подпрограмме: -	—	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (км)	584,33	587,19	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием возможности своевременной корректировки планового значения целевого индикатора по результатам выполненных работ в пределах выделенного финансирования, ввиду сдачи актов выполненных работ в сроки, не позволяющие внести изменения в муниципальную программу
							Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения (единиц)	17 639	17 764		
							Общая протяженность сети уличного освещения (км)	760,83	763,69		
							Средняя мощность 1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения (Вт)	208,89	208,89		
							Общая годовая продолжительность работы сети	3 882	3 882		

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							уличного освещения (часов)				
							Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети (%)	15,20	15,20		
	Мероприятие «Наружное освещение» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	159 866,48	150 356,78		17858,00		Мероприятие выполнено на 94,05 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованностью денежных средств. Работы выполнены в полном объеме	_____	_____	_____	_____
6.3.	Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	84 025,17	82 497,85	Итого по подпрограмме: 1 527,32	Итого по подпрограмме: 8 624,60	Итого по подпрограмме: -	_____	Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании (кв. м)	158 062,00	158 062,00	
Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) (км прохода)								11 147,00	11 147,00		
Общая площадь чаш фонтанов (кв. м)								861	861		
Объем ликвидированных стихийных свалок (м3)								35 364,00	50 730,00	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием возможности	
Объем вывезенного								3 673,00	6 152,00		

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							мусора при проведении субботников (м3)				своевременной корректировки планового значения
							Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона (м3)	254	171		целевого индикатора по результатам выполненных работ в пределах выделенного финансирования, ввиду сдачи актов выполненных работ в сроки, не позволяющие внести изменения в муниципальную программу
							Количество эвакуированного брошенного и разукрупленного транспорта (единиц)	7	5		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что после проведения мероприятий по предупреждению об эвакуации транспортных средств их владельцы выполнили эвакуацию своих автомобилей за счет собственных средств
							Содержание, ремонт объектов озеленения (кв. м)	48 400,16	48 400,16		
							Цвегочное оформление (кв. м)	1 952,04	1 952,04		
							Выкашивание газонов механизированным способом (100 кв. м)	21 744,71	19 120,88		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с несвоевременной корректировкой планового значения целевого индикатора

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	(управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова)										
6.4.	Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	15 454,77	15 454,77	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: 2 363,70	Итого по подпрограмме: -	_____	Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (тыс. кв. м)	2 519,84	2 519,84	
								Организация и ведение учета захоронений (ед.)	5 100	4 969	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с несвоевременной корректировкой планового значения целевого индикатора
								Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время (единиц)	0	0	
								Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги (единиц)	0	0	
	Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений» (управление благоустройства Администрации	15 454,77	15 454,77		2 363,70		Мероприятие выполнено на 100 %	_____	_____	_____	_____

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	города Иванова)										
6.5.	Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	2 162,50	1 814,01	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Число отловленных безнадзорных животных (особей)	348	348	
	Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	742,50	618,65				Мероприятие выполнено на 83,32 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с не востребова ностью денежных средств. Работы выполнены в полном объеме	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Регулирование	1 420,00	1 195,36				Мероприятие выполнено на	_____	_____	_____	_____

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности» (управление благоустройства Администрации города Иванова)						84,18 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованностью денежных средств. Работы выполнены в полном объеме				
6.6.	Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	17 219,60	16 972,18	Итого по подпрограмме: 200,73	Итого по подпрограмме: 2 631,6	Итого по подпрограмме: -	_____	Протяженность объектов уличного освещения, выполненным самонесущим изолированным проводом (км)	12,91	11,81	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием возможности своевременной корректировки планового значения целевого индикатора по результатам выполненных работ в пределах выделенного финансирования, ввиду сдачи актов выполненных работ в сроки, не позволяющие внести изменения в муниципальную программу
	Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами (единиц)	368	320								
	Протяженность объектов уличного освещения, на которых выполнены работы по устройству недостающего освещения (км)	1,90	2,08								
	Число установленных светильников в рамках устройства недостающего электроосвещения	88	89								

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактически осуществленных расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							на дорогах общего пользования (ед.)				
							Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования (км)	1,20	2,00		
	Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	78,65	78,65								
	Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	13 844,40	13 643,61	200,73	2 631,60		Мероприятие выполнено на 98,55 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с образовавшейся экономии, полученной по итогам проведения				

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
							конкурентных процедур				
	Мероприятие «Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	3 020,41	2 973,78				Мероприятие выполнено на 98,46 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с расторжением муниципального контракта по соглашению сторон	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	276,14	276,14				Мероприятие выполнено на 100 %	_____	_____	_____	_____
6.7.	Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	2 461,72	2 461,71	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках (га)	1	1	
	Мероприятие «Расширение городского	2 461,72	2 461,71				Мероприятие выполнено на 100 %	_____	_____	_____	_____

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)										
6.8.	Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	2 377,77	2 342,25	Итого по подпрограмме: 35,52	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения (км)	0,958	0,958	
								Число установленных светильников на объектах уличного освещения (единиц)	37	37	
								Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство (км)	3,384	3,384	
	Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения» (управление капитального строительства Администрации	290,00	290,00				Мероприятие выполнено на 100 %	_____	_____	_____	_____

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	города Иванова)										
	Мероприятие «Строительство объектов уличного освещения» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	2 051,77	2 016,25	35,52			Мероприятие выполнено на 98,27 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с образованием экономии, полученной по итогам проведения конкурентных процедур	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов уличного освещения в казну города Иванова» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	36,00	36,00				Мероприятие выполнено на 100 %	_____	_____	_____	_____
6.9.	Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды» (управление благоустройства)	10 501,24	8 867,29	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -		_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (управление	2 334,40	2 334,40				Мероприятие выполнено на 100 %	Целевые индикаторы не предусмотрены, реализация подпрограммы направлена на уплату кредиторской задолженности по работам, выполненным в 2017 году на основании актов выполненных работ. В 2018 году мероприятия, направленные на исполнение целевых индикаторов данной сферы, реализовывались в рамках муниципальной программы			

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
	жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)										«Формирование современной городской среды» (головной исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова), утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22
	Мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» (управление благоустройства)	8 166,84	6 532,89				Мероприятие выполнено на 79,99 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с неустребованностью денежных средств. Работы оплачены по факту выполнения				Целевые индикаторы не предусмотрены, реализация подпрограммы направлена на уплату работ, выполненных в 2017 году на основании актов выполненных работ, в рамках заключенного Мирового Соглашения. В 2018 году мероприятия, направленные на исполнение целевых индикаторов данной сферы, реализовывались в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (головной исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова), утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22
